

## Abnahme-Bescheinigung Haustür mit elektronischen Bauteilen


für den Monteur

Bauvorhaben: .....



### Probetrieb 2 / VS-Paket 05 - A-Öffner + Connect mit Fingerscan wie folgt durchgeführt:

1. Tür im geschlossenen Zustand, schwarzes Kabel mit Strom AC 230 V versorgen bzw. einstecken und 1 Minute warten.

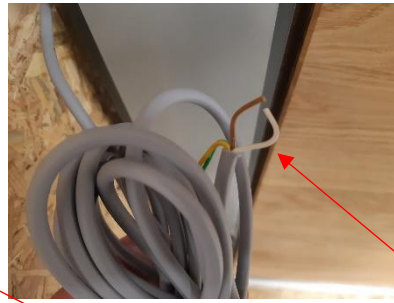

2. Wenn die Minute vorbei ist, nehmen Sie das graue Kabel und verbinden **braun** mit **weiß**, dadurch wird ein Signal (Öffnung über Sprechanlage simuliert) zum A-Öffner gesendet, der die Türe Kurzzeit öffnet. Nach dem Schließen verriegelt sich die Türe wieder automatisch.

3. Testbetrieb Fingerscan: Nach dem vorherigen Probetrieb 1 und 2 führen Sie innerhalb der nächsten 10 Minuten den Test durch. (Sind die 10 Minuten abgelaufen, ist dieser Test erst nach einem Power-on-Reset des Fingerscan möglich).

Test



Fingerscanner  
ist mit SC200 ge-  
koppelt. Es ist kein  
Finger gespeichert



Legen Sie einen  
Finger für 3 – 5 s  
auf den Sensor.



Wenn Sie den  
Finger entfernen,  
schaltet das Relais

**Die von uns gelieferte und montierte Türanlage gilt hiermit als abgenommen.**

Monteur - Firma / Name.....

Datum / Unterschrift.....

Kunde - Name.....

Datum / Unterschrift.....
