

Abnahme-Bescheinigung Haustür mit elektronischen Bauteilen



für den Monteur

Bauvorhaben:

Auflage 2020_1

Probetrieb 1 / VS-Paket 03 und 04 - A-Öffner + Connect wie folgt durchgeführt:

1. Tür im geschlossenen Zustand, schwarzes Kabel mit Strom AC 230 V versorgen bzw. einstecken und 1 Minute warten.

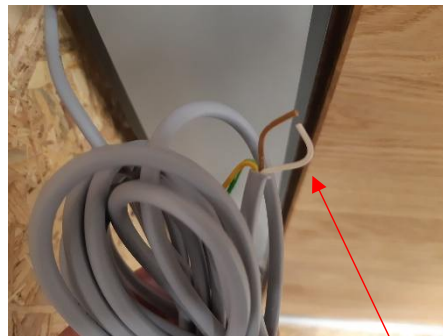

2. Wenn die Minute vorbei ist, nehmen Sie das graue Kabel und verbinden **braun** mit **weiß**, dadurch wird ein Signal (Öffnung über Sprechanlage simuliert) zum A-Öffner gesendet, der die Türe Kurzzeit öffnet. Nach dem Schließen verriegelt sich die Türe wieder automatisch.

Die von uns gelieferte und montierte Türanlage gilt hiermit als abgenommen.

Monteur - Firma / Name.....

Datum / Unterschrift.....

Kunde - Name.....

Datum / Unterschrift.....
